



กฟ. ๙๗(๓)ค-๐๕

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน  
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑-๒  ไตรมาสที่ ๓-๔  สิ้นสุดโครงการ

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน... ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพลวง.....  
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี..... รหัสโครงการ.....  
แผนงาน..... ด้านสาธารณูปโภค.....  
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวันเริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ) ๒๖.๑๑.๖๖ - วันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๖.....  
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง.....

๒. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๘๓,๘๐๐.-..... บาท ประกอบด้วย  
เงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ๔๘๓,๘๐๐.-..... บาท  
เงินงบประมาณสมทบสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ -..... บาท  
เบิกจ่ายแล้ว -..... บาท คงเหลือเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า -..... บาท

๓. สถานภาพการดำเนินโครงการ (ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน  ได้มากกว่า ๑ ช่อง )

ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  เสร็จสิ้นแล้ว  ล่าช้า

๔. ความก้าวหน้าโครงการ (เมื่อเทียบกับแผน กิจกรรมที่กำหนดไว้ และผลการดำเนินงานจนถึงวันสุดท้ายของงวดที่รายงาน)

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานสำคัญโดยสรุป (ระบุความสำเร็จ ของกิจกรรมและโครงการที่กำหนด)	ปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงาน โครงการ	แนวทางการ แก้ปัญหา
๑	โครงการขยายระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบล บางพลวง	ขยายระบบท่อน้ำประปา หมู่บ้าน วางท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิด ปลายธรรมชาติ ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๓” (มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒) ยาว ๔ เมตร จำนวนระยะทาง ๒,๒๐๐	ไม่มี	ไม่มี

		เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด =			๑๐๐	

๕. แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป ( ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน  )

- ตามแผนงานเดิมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ  
 มีการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอโครงการ

เหตุผล/ความจำเป็น ในการปรับเปลี่ยน.....  
 .....  
 .....  
 กิจกรรม รายละเอียด และระยะเวลา ที่จะปรับเปลี่ยน.....  
 .....  
 .....

๖. วัตถุประสงค์โครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (เมื่อสิ้นสุดโครงการ)

ที่	วัตถุประสงค์	ประโยชน์ที่ได้รับ
๑	เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการน้ำใช้ในการอุปโภคของประชาชน หมู่ที่ ๖	ประชาชน หมู่ที่ ๖ เข้าถึงบริการระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น
๒	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๖ มีน้ำในการอุปโภคอย่างเพียงพอต่อความจำเป็นในการดำเนินชีวิต	ประชาชน หมู่ที่ ๖ ได้ใช้น้ำในการอุปโภคอย่างเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
๓	เพื่อพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถบริการประชาชน หมู่ที่ ๖ ได้อย่างทั่วถึง	ระบบประปาหมู่บ้านได้รับการพัฒนาในการขยายบริการให้แก่ประชาชน


๗. เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรมไม่เกิน ๑๐ ภาพ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ (ระบุ ชื่อภาพ /กิจกรรม วันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม)

- ๑).....รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย.....  
 ๒).....  
 ๓).....

๘. การส่งคืนเงินโครงการชุมชนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้นำส่งคืนเงินภายใน ๓๐ วันหลังจาก  
เสร็จสิ้นโครงการ หรือนับจากวันที่มีเงินเหลือจ่าย พร้อมแนบหลักฐาน แบบฟอร์มการส่งคืนเงินเหลือจ่าย  
กฟ. ๙๗(๓)ค-๐๖ มาด้วย

ส่งคืนเงินวันที่.....-.....จำนวนเงิน.....-.....(บาท)

ลงชื่อ  ผู้รายงาน  
( นางวรรณภัส ประสงค์ )  
ตำแหน่ง รองปลัด อบต. บางพลวง (ระบุงหามี่)  
วัน/เดือน/ปี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ  ผู้รับรอง  
( นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ )  
ตำแหน่ง นายกอบต.บางพลวง (ระบุงหามี่)  
วัน/เดือน/ปี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เอกสารแนบท้ายโครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒  
ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



เอกสารแนบท้ายโครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖  
ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



เอกสารแนบท้ายโครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖  
ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี





กฟ. ๙๗(๓)ค-๐๕

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน  
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑-๒  ไตรมาสที่ ๓-๔  สิ้นสุดโครงการ

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน... ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ จุด ตำบลบางพลวง  
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รหัสโครงการ  
แผนงาน ด้านสาธารณูปโภค  
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวันเริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ) ๒๖ ก.ค. ๖๖ - ๒๔ ต.ค. ๖๖  
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง

๒. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๘๓,๘๐๐.- บาท ประกอบด้วย  
เงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ๔๘๓,๘๐๐.- บาท  
เงินงบประมาณสมทบสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ - บาท  
เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - บาท

๓. สถานภาพการดำเนินโครงการ (ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน  ได้มากกว่า ๑ ช่อง )

ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  เสร็จสิ้นแล้ว  ล่าช้า

๔. ความก้าวหน้าโครงการ (เมื่อเทียบกับแผน กิจกรรมที่กำหนดไว้ และผลการดำเนินงานจนถึงวันสุดท้ายของงวดที่รายงาน)

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานสำคัญโดยสรุป (ระบุความสำเร็จ ของกิจกรรมและโครงการที่กำหนด)	ปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงาน โครงการ	แนวทางการ แก้ปัญหา
๑	โครงการขยายระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ จุด ตำบลบางพลวง	ขยายระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ วางท่อ พีวีซี แข็ง ท่อ ประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ ขนาด $\varnothing$ ๓" (มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒) ยาว ๔ เมตร จำนวน	ไม่มี	ไม่มี

	ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร จุดที่ ๒ วางท่อ พีวีซี แข็ง ท่อ ประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ ขนาด $\varnothing$ ๓" (มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒) ยาว ๔ เมตร จำนวน ระยะทาง ๔๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด =		๑๐๐	

๕. แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป ( ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน  )

- ตามแผนงานเดิมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ  
 มีการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอโครงการ

เหตุผล/ความจำเป็น ในการปรับเปลี่ยน.....

กิจกรรม รายละเอียด และระยะเวลา ที่จะปรับเปลี่ยน.....

๖. วัตถุประสงค์โครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (เมื่อสิ้นสุดโครงการ)

ที่	วัตถุประสงค์	ประโยชน์ที่ได้รับ
๑	เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการน้ำใช้ในการอุปโภคของประชาชน หมู่ที่ ๘	ประชาชน หมู่ที่ ๘ เข้าถึงบริการระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น
๒	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๘ มีน้ำในการอุปโภคอย่างเพียงพอต่อความจำเป็นในการดำเนินชีวิต	ประชาชน หมู่ที่ ๘ ได้ใช้น้ำในการอุปโภคอย่างเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
๓	เพื่อพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถบริการประชาชน หมู่ที่ ๘ ได้อย่างทั่วถึง	ระบบประปาหมู่บ้านได้รับการพัฒนาในการขยายบริการให้แก่ประชาชน

๗. เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม ไม่เกิน ๑๐ ภาพ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ (ระบุ ชื่อภาพ /กิจกรรม วันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม)

๑).....รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย.....

๒).....

๓).....

๘. การส่งคืนเงินโครงการชุมชนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้นำส่งคืนเงินภายใน ๓๐ วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หรือนับจากวันที่มีเงินเหลือจ่าย พร้อมแนบหลักฐาน แบบฟอร์มการส่งคืนเงินเหลือจ่าย กฟ. ๙๗(๓)ค-๐๖ มาด้วย


ส่งคืนเงินวันที่.....-.....จำนวนเงิน.....-.....(บาท)

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

( นางวรรณภัส ประสงค์ )

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บางพลวง.....(ระบุหากมี)

วัน/เดือน/ปี.....๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

( นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ )

ตำแหน่ง นายก อบต.บางพลวง (ระบุหากมี)

วัน/เดือน/ปี.....๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เอกสารแนบท้ายโครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ จุด  
ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



เอกสารแนบท้ายโครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ จุด  
ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



เอกสารแนบท้ายโครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ จุด  
ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



เอกสารแนบท้ายโครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ จุด  
ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี







กฟ. ๙๗(๓)ค-๐๕

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน  
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑-๒  ไตรมาสที่ ๓-๔  สิ้นสุดโครงการ

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางพลวง  
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รหัสโครงการ  
แผนงาน ด้านสาธารณสุขโลก  
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวันเริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ) ๒๖ ก.ค.๖๖ - ๓๐ ต.ค. ๖๖  
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง

๒. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๑๒,๓๐๐.- บาท ประกอบด้วย  
เงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ๓๑๒,๓๐๐.- บาท  
เงินงบประมาณสมทบสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ - บาท  
เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - บาท

๓. สถานภาพการดำเนินโครงการ (ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน  ได้มากกว่า ๑ ช่อง )

ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  เสร็จสิ้นแล้ว  ล่าช้า

๔. ความก้าวหน้าโครงการ (เมื่อเทียบกับแผน กิจกรรมที่กำหนดไว้ และผลการดำเนินงานจนถึงวันสุดท้ายของงวดที่รายงาน)

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานสำคัญโดยสรุป (ระบุความสำเร็จ ของกิจกรรมและโครงการที่กำหนด)	ปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงาน โครงการ	แนวทางการ แก้ปัญหา
๑	โครงการขยายระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบล บางพลวง	ขยายระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน วางท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิด ปลายธรรมชาติ ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๓" (มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒) ยาว ๔ เมตร จำนวนระยะทาง ๑,๔๒๐	ไม่มี	ไม่มี

		เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด =				๑๐๐

๕. แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป ( ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน  )

- ตามแผนงานเดิมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ  
 มีการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอโครงการ

เหตุผล/ความจำเป็น ในการปรับเปลี่ยน.....  
 .....  
 .....  
 กิจกรรม รายละเอียด และระยะเวลา ที่จะปรับเปลี่ยน.....  
 .....  
 .....

๖. วัตถุประสงค์โครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (เมื่อสิ้นสุดโครงการ)


ที่	วัตถุประสงค์	ประโยชน์ที่ได้รับ
๑	เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการน้ำใช้ในการอุปโภคของประชาชน หมู่ที่ ๙	ประชาชน หมู่ที่ ๙ เข้าถึงบริการระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น
๒	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๙ มีน้ำในการอุปโภคอย่างเพียงพอต่อความจำเป็นในการดำเนินชีวิต	ประชาชน หมู่ที่ ๙ ได้ใช้น้ำในการอุปโภคอย่างเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
๓	เพื่อพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถบริการประชาชน หมู่ที่ ๙ ได้อย่างทั่วถึง	ระบบประปาหมู่บ้านได้รับการพัฒนาในการขยายบริการให้แก่ประชาชน

๗. เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรมไม่เกิน ๑๐ ภาพ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ (ระบุ ชื่อภาพ /กิจกรรม วันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม)

- ๑).....รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย.....  
 ๒).....  
 ๓).....

๘. การส่งคืนเงินโครงการชุมชนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้นำส่งคืนเงินภายใน ๓๐ วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หรือนับจากวันที่มีเงินเหลือจ่าย พร้อมแนบหลักฐาน แบบฟอร์มการส่งคืนเงินเหลือจ่าย กฟ. ๙๗(๓)ค-๐๖ มาด้วย


ส่งคืนเงินวันที่.....-.....จำนวนเงิน.....(บาท)

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

( นางวรรณภัส ประสงค์ )

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บางพลวง.....(ระบุงหามี่)

วัน/เดือน/ปี.....๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

( นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ )

ตำแหน่ง นายก อบต.บางพลวง (ระบุงหามี่)

วัน/เดือน/ปี.....๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เอกสารแนบท้ายโครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙  
ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



เอกสารแนบท้ายโครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙  
ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี





กฟ. ๙๗(๓)ค-๐๕

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน  
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑-๒  ไตรมาสที่ ๓-๔  สิ้นสุดโครงการ

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ จุด ตำบลบางพลวง

อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รหัสโครงการ

แผนงาน ด้านสาธารณูปโภค

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวันเริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ) ๒๖ ก.ค. ๖๖ - ๒๗ ต.ค. ๖๖

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง

๒. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๐๘,๕๐๐.- บาท ประกอบด้วย

เงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ๓๐๘,๕๐๐.- บาท

เงินงบประมาณสมทบสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ - บาท

เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - บาท

๓. สถานภาพการดำเนินโครงการ (ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน  ได้มากกว่า ๑ ช่อง )

ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  เสร็จสิ้นแล้ว  ล่าช้า

๔. ความก้าวหน้าโครงการ (เมื่อเทียบกับแผน กิจกรรมที่กำหนดไว้ และผลการดำเนินงานจนถึงวันสุดท้ายของงวดที่รายงาน)

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานสำคัญโดยสรุป (ระบุความสำเร็จของกิจกรรมและโครงการที่กำหนด)	ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการ	แนวทางการแก้ปัญหา
๑	โครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ จุด ตำบลบางพลวง	ขยายระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ วางท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ ขนาด $\varnothing ๒$ " (มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒) ยาว ๔ เมตร จำนวน	ไม่มี	ไม่มี

	ระยะทาง ๑,๑๖๐ เมตร จุดที่ ๒ วางท่อ พีวีซี แข็ง ท่อ ประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ ขนาด $\varnothing$ ๓" (มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒) ยาว ๔ เมตร จำนวน ระยะทาง ๘๗๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด =		๑๐๐	

๕. แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป (ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน  )

ตามแผนงานเดิมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ

มีการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอโครงการ

เหตุผล/ความจำเป็น ในการปรับเปลี่ยน.....

.....

กิจกรรม รายละเอียด และระยะเวลา ที่จะปรับเปลี่ยน.....

.....

.....

๖. วัตถุประสงค์โครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (เมื่อสิ้นสุดโครงการ)

ที่	วัตถุประสงค์	ประโยชน์ที่ได้รับ
๑	เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการน้ำใช้ในการอุปโภคของประชาชน หมู่ที่ ๑๐	ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ เข้าถึงบริการระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น
๒	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ มีน้ำในการอุปโภคอย่างเพียงพอต่อความจำเป็นในการดำเนินชีวิต	ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ ได้ใช้น้ำในการอุปโภคอย่างเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
๓	เพื่อพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถบริการประชาชน หมู่ที่ ๑๐ ได้อย่างทั่วถึง	ระบบประปาหมู่บ้านได้รับการพัฒนาในการขยายบริการให้แก่ประชาชน

๗. เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม ไม่เกิน ๑๐ ภาพ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ (ระบุ ชื่อภาพ /กิจกรรม วันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม)

๑).....รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย.....

๒).....

๓).....

๘. การส่งคืนเงินโครงการชุมชนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้นำส่งคืนเงินภายใน ๓๐ วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หรือนับจากวันที่มีเงินเหลือจ่าย พร้อมแนบหลักฐาน แบบฟอร์มการส่งคืนเงินเหลือจ่าย กฟ. ๙๗(๓)ค-๐๖ มาด้วย


ส่งคืนเงินวันที่..... - .....จำนวนเงิน..... - .....(บาท)

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

( นางวรรณภัส ประสงค์ )

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บางพลวง.....(ระบุงหามมี)

วัน/เดือน/ปี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖


ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

( นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ )

ตำแหน่ง นายก อบต.บางพลวง (ระบุงหามมี)

วัน/เดือน/ปี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เอกสารแนบท้ายโครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ จุด  
ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

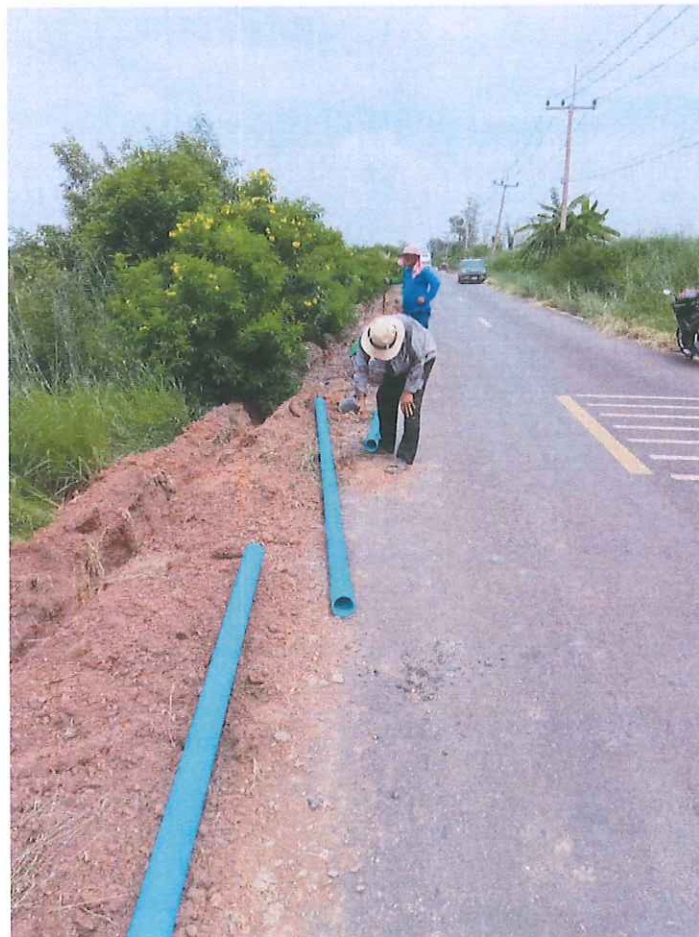

เอกสารแนบท้ายโครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ จุด  
ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



เอกสารแนบท้ายโครงการขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ จุด  
ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

